

— Plataforma de gestión · llave en mano

Toda la operación en una sola plataforma, desde cualquier lugar

Presupuestos, obras, materiales, compras, taller, contratistas, proveedores, clientes y finanzas en una sola plataforma en la nube, con inteligencia artificial en el corazón del sistema. **Cada fase se libera contra firma de su acta: si una no cierra, la siguiente no arranca.** Todo lo entregado queda en la nube de Remodela, a su nombre, desde el primer día.

Diseño	Primera entrega
3 ago 2026	15 oct 2026
Entrega completa	Inversión
28 feb 2027	USD 24.000


• Lo que cuesta seguir igual

Ninguno de estos números aparece en una factura — por eso hoy se pagan sin verse. Son estimaciones de la reunión del 21 de julio y se revisan juntos antes de firmar.

- 480 horas al año · *administración* · diez horas por semana transcribiendo a mano el control de contratistas. Doce semanas completas de una persona, copiando de un sistema a una hoja de cálculo.
- 144 horas al año · *los jueves* · tres horas cada semana discutiendo qué se terminó y qué no. Dieciocho días laborales del dueño, en una conversación que una foto con fecha resuelve en un minuto.
- USD 15.000 al año · *margen* · si el costo real se desvía tres puntos del estimado, es dinero que aparece al cerrar la obra, cuando ya no se puede corregir nada.
- Sin red · *continuidad* · el sistema corre en una máquina de la oficina, sin respaldo automático y sin autor disponible. Si esa máquina falla mañana, se pierden los presupuestos, las cuentas por cobrar y la caja.

Cómo se entrega

Cronograma · cinco fases, 43 módulos

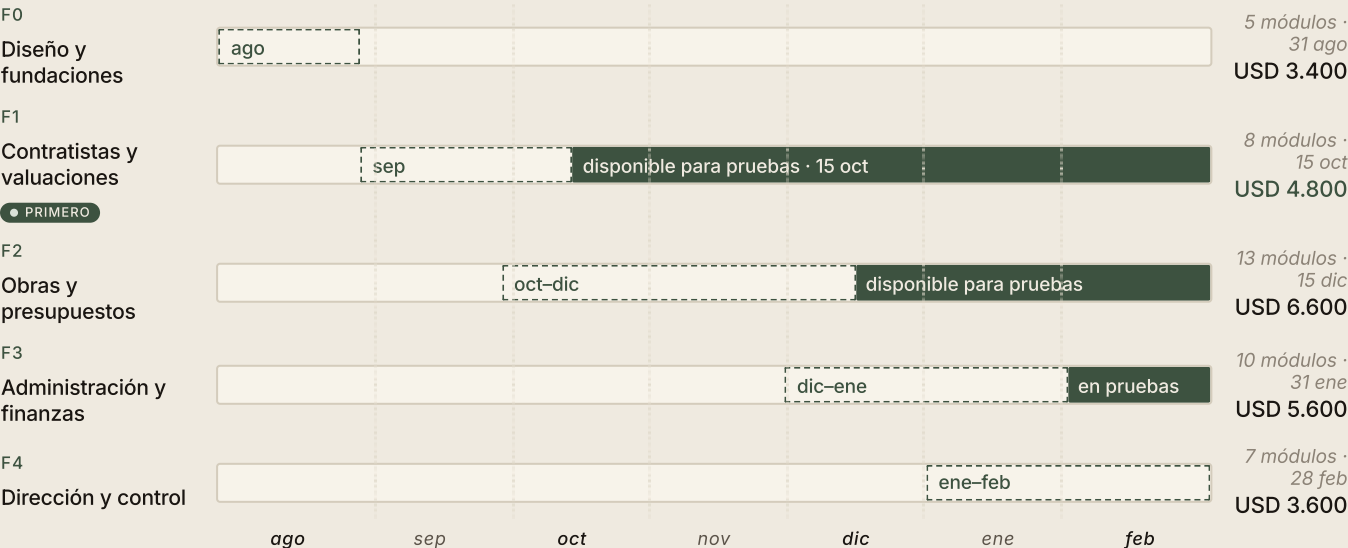

Inversión

USD 24.000total

Contrato de obra · tres ingenieros dedicados · anticipo del 20% · siete valuaciones mensuales · retención del 10% · más el ingeniero residente por USD 850 al mes desde agosto

El alcance, completo

- Obras, presupuestos, órdenes de cambio y moneda dual
- Materiales con memoria de precios, compras y taller
- Portal de contratistas con expediente de avance y orden de pago
- Financiero, conciliación asistida y costo real contra presupuestado
- Tablero de aeropuerto, asistente de IA y comunicaciones al cliente

El código, la nube y la base de datos se abren a nombre de Remodela tu Mundo desde el primer día, con Diego como dueño de las cuentas. Cada fase se libera contra firma de su acta y puede terminarse ahí sin penalidad, conservando lo entregado.

Próximo paso

La aceptación se formaliza con la firma del contrato de obra y el anticipo de movilización. Cerrando antes del **31 de julio**, el diseño arranca el **lunes 3 de agosto**.

Vigencia de esta propuesta: 14 de agosto de 2026.

Las páginas siguientes detallan cada fase con sus módulos, el equipo asignado y las condiciones del contrato.

f0 Diseño y fundaciones

AGOSTO · USD 3.400

Un mes entero antes de programar. Las pantallas se dibujan con el equipo de Remodela, y el modelo de datos se decide con la operación real a la vista. Es la fase que hace que seis meses de desarrollo sean creíbles.

3 ago 28 feb

Los módulos

- 0.01

Diseño de pantallas con el equipo

Sesiones con la administradora, las arquitectas y los ingenieros para dibujar cada pantalla antes de programarla. Ellos ayudan a construirla, así que después la defienden.
- 0.02

Modelo de datos

Cómo se relacionan obras, fases, partidas, líderes, contratistas, materiales, proveedores y cuentas. Equivocarse aquí se paga en el mes cinco.
- 0.03

Infraestructura y cuentas

Nube, base de datos y dominio abiertos a nombre de Remodela tu Mundo, con el correo de Diego como dueño. crescō entra como colaborador.
- 0.04

Respaldo del sistema actual

Si Remodela facilita el acceso al servidor de la oficina, se configura una copia automática diaria. Depende de ese acceso; si no es posible, la fase 0 lo documenta y sigue.
- 0.05

Extracción y diagnóstico

Volcado completo de la base actual y un informe escrito: qué se puede migrar, qué no, cuánto cuesta y en qué fecha. Nada se cotiza a ciegas.

¿Por qué va primero?

Porque el sistema actual corre en una máquina sin respaldo y su autor ya no puede dar soporte; el módulo **0.04** busca reducir ese riesgo apenas haya acceso. Y porque programar sobre pantallas ya aprobadas es lo que permite comprimir el desarrollo a seis meses.

El acta

31 de agosto. El equipo de Remodela aprueba las pantallas antes de que se escriba una línea de código.

f1 Contratistas y valuaciones

SEP – 15 OCT · USD 4.800

La fase que ataca el dolor mayor y por eso va de primera. El martes cada líder de equipo entra desde su propio Android, ve solo sus partidas y sube las fotos con fecha y ubicación. El jueves la valuación llega armada y se aprueba de un toque. La administradora deja de abrir el Excel.

sep – 15 oct  28 feb

Los módulos

- 1.01

Usuarios, roles y permisos

Diego, la administradora, ingenieros, arquitectas, diseñadoras, líderes de equipo, contratistas y proveedores. Cada quien ve lo suyo y nada más.
- 1.02

Matriz de visibilidad

Quién puede ver el costo y quién solo el precio de venta. Se define con Diego y se firma, porque el margen depende de eso.
- 1.03

Obras por fases y partidas

La obra como se maneja hoy: dirección, cliente, fecha, fases que entran una detrás de otra y partidas dentro de cada fase.
- 1.04

Líderes y cuadrillas

La jerarquía real de la empresa: Diego habla con los líderes y cada líder responde por su gente. Las partidas se asignan al equipo, no a treinta personas sueltas.
- 1.05

Portal del contratista

Entra desde su propio Android con usuario y clave y ve solo sus partidas abiertas. Sin comprar equipos nuevos, sin pantallas partidas, sin teléfonos extraviados entre obra y obra.
- 1.06

Expediente de avance

Fotos y video tomados con la cámara del sistema, con fecha y ubicación, comparados contra la evidencia de la semana anterior y contra lo presupuestado. Queda guardado por obra para siempre.
- 1.07

Valuación semanal y orden de pago

El sistema arma la valuación del jueves, la revisa y la presenta ordenada. La aprobación es humana, de un toque, y ahí se genera la orden de pago.
- 1.08

Recordatorios de día de pago

Avisos automáticos a cada contratista: cuándo cargar, qué falta y cuál es el día de cobro. Esa conversación deja de pasar por Diego.

La inteligencia artificial no aprueba pagos. Arma el expediente, verifica que la evidencia corresponda a la partida y esté completa, y precarga la valuación. Quien libera el dinero sigue siendo una persona. Prometer aprobación automática de pagos sería vender algo que no se puede sostener el día que se equivoca.

El acta

15 de octubre. La valuación de la semana armada por el sistema y aprobada de un toque, disponible para pruebas del equipo. Cuatro meses y medio antes de que el proyecto termine.

f2 Obras y presupuestos

OCT - 15 DIC · USD 6.600

El corazón comercial. La base de materiales con memoria de precios entra junto con los presupuestos, no después, para que ninguna arquitecta tenga que escribir dos veces el mismo tubo. Aquí viven los márgenes, las órdenes de cambio, las procuras y el taller.

3 ago 15 dic

Los módulos

- 2.01

Catálogo de materiales

La base de datos que hoy no existe, con memoria del último precio pagado por cada material. Se construye sola a medida que se trabaja.
- 2.02

Proveedores y comparación

Quién vendió qué, a cuánto y cuándo. Cuando tres proveedores compiten por el mismo material, se ve en una línea.
- 2.03

Estimación de costos

La plantilla de materiales, cantidades, precios y mano de obra que operaciones ya usa, ahora sin escribir nada dos veces.
- 2.04

Márgenes por tipo de venta

La obra completa a 1,6 y el producto fabricado a 2, configurables. El sistema calcula venta y utilidad al vuelo.
- 2.05

Presupuesto, aprobado, entregado

El ciclo de siempre, con los correlativos que ya se usan, el candado de aprobación y el formato imprimible para el cliente.
- 2.06

Moneda dual y política de tasas

Precio en dólares y en bolívares. Se define cuál tasa se automatiza, cuál se carga a mano y con cuál se congela cada documento: un presupuesto aprobado hace tres meses, un abono parcial, una cuenta por pagar vieja.
- 2.07

Órdenes de cambio y adicionales

Cuando el cliente decide a mitad de obra que quiere el mesón de granito, el adicional se cotiza, se aprueba y se suma al presupuesto sin romper el original ni volver al Excel.
- 2.08

Repositorio documental por obra

Planos, diseños en 3D, contratos, permisos y fotos, colgados de cada obra. Hoy eso vive regado entre teléfonos y correos.
- 2.09

Órdenes de compra

Procuras con numeración automática y el flujo de aprobación actual: se carga, llega el aviso, y Diego aprueba, modifica o elimina. El soporte se numera solo.
- 2.10

Taller: órdenes de trabajo

Carpintería y cristalería con sus propias órdenes, sus fechas y su carga de trabajo frente a las obras que corren afuera.

2.11 **Costeo de producto fabricado**

Cuánto costó de verdad un centro de entretenimiento, con el material consumido del inventario y la mano de obra del taller. Es la única forma de saber si el 2 que se cobra es real.

2.12 **Agenda de pagos y comisiones**

A quién se le paga hoy y a quién mañana, ordenado por fecha y por obra. Y las comisiones de venta calculadas solas.

2.13 **Buscador global y asistente inicial**

Se escribe el nombre de un cliente y aparecen sus obras, su estado y sus pagos. Primera versión del asistente, respondiendo sobre obras y presupuestos.

El acta

15 de diciembre. Un presupuesto completo armado sin escribir un solo material a mano.

f3 Administración y finanzas

DIC – 31 ENE · USD 5.600

Cuentas, cajas, conciliación y nómina. Y la pieza que cambia cómo se dirige la empresa: el costo real contra el presupuestado, en vivo, para saber si una obra está dejando utilidad en la semana seis, no al cerrarla.



Los módulos

3.01	Cuentas por cobrar y abonos	Los abonos del cliente registrados una sola vez, con el recibo generado y enviado desde el sistema.
3.02	Cuentas por pagar	Proveedores y contratistas en una sola vista, con lo que se debe, lo abonado y la fecha comprometida.
3.03	Caja de obra y caja de banco	Efectivo y banco, con arqueo. Quién custodia, quién rinde y contra qué obra se descarga cada gasto.
3.04	Reporte de Zelle	Los pagos por Zelle agrupados solos, sin que nadie los transcriba.
3.05	Conciliación asistida	Se carga el estado de cuenta y el sistema propone los cruces; la administradora confirma. De horas a minutos.
3.06	Costo real contra presupuestado	Por obra y por partida, en vivo. La utilidad deja de ser una sorpresa del cierre.
3.07	Umbrales de aprobación y suplentes	Una compra pequeña avanza sola; una grande espera. Y cuando Diego se desconecta, hay un suplente definido. Es la diferencia entre digitalizar las veinte llamadas y eliminarlas.
3.08	Pago a contratistas	Orden aprobada, archivo listo para cargar en la banca en línea, comprobante capturado y partida cerrada sola. Efectivo y transferencia como caminos válidos, con su soporte contable.
3.09	Nómina	Las seis personas fijas, quincena y último, con su recibo.
3.10	Migración de históricos	Obras cerradas, cuentas y clientes traídos del sistema actual y cuadrados contra saldos, no copiados a la ligera.

Lo que no hace

El sistema **no emite facturas fiscales**. Desde la Providencia SNAT/2024/000121 el SENIAT regula al proveedor del software, no al contribuyente: todo sistema que emita facturas debe estar homologado, versión por versión. La plataforma prepara los documentos y se integra con un sistema ya homologado que Remodela contrata aparte. Tampoco hay **débito bancario automático**: el pago móvil empresarial venezolano sirve para cobrar, no para dispersar.

El acta

31 de enero. Un cierre de mes completo cuadrado dentro de la plataforma, contra los soportes bancarios y contables.

f4 Dirección y control

ENE – 28 FEB · USD 3.600

La fase que le devuelve a Diego la posibilidad de desconectarse. Todas las obras en una pantalla, el asistente respondiendo con los datos de la casa, los clientes recibiendo su avance por WhatsApp sin que nadie lo arme a mano, y el traspaso documentado.

3 ago  28 feb

Los módulos

- 4.01

Tablero de aeropuerto

Todas las obras de una pasada: fase, avance, salud financiera y qué necesita atención hoy. El nombre lo puso Diego en la reunión.
- 4.02

Avance y alertas

Cronograma visual por obra y avisos cuando una partida se atrasa, un presupuesto se desvía o una cuenta se vence.
- 4.03

Asistente completo

Conectado a toda la base de datos: obras, compras, cuentas, contratistas y caja. Se le pregunta en lenguaje normal y responde con los números de la casa.
- 4.04

Comunicaciones al cliente

Correo y WhatsApp desde la plataforma, con reportes de avance y fotos reales de obra, revisadas antes de salir.
- 4.05

Portal de proveedores

Cargan su factura y su soporte directo a cuentas por pagar, sin que nadie los transcriba.
- 4.06

Seguridad y auditoría

Revisión de accesos y de la información financiera, respaldos verificados, monitoreo y pruebas con datos reales.
- 4.07

Documentación y traspaso

Manual del equipo, documentación técnica y video de traspaso en el Drive de Remodela, para que cualquier desarrollador pueda continuar sin crescō.

El acta

28 de febrero. La entrega completa de la plataforma, con la documentación y el traspaso firmados por Remodela.

El equipo

OCHO CARGOS

Un solo ingeniero fijo se ve más barato en la factura. Lo que no se ve es el resto: esta plataforma toca siete oficios distintos, y muy pocas personas dominan bien más de dos. Un ingeniero solo levanta una parte respetable del sistema e improvisa el resto — y eso se descubre cuando el sistema ya está dentro de la operación.

El punto de falla

Y hay algo más, que no es una crítica a nadie: **una sola persona es un solo punto de falla**. No hace falta que nada salga mal a propósito para quedarse sin sistema: basta un imprevisto. Remodela ya lo vivió, y no fue culpa de quien hizo el programa — fue del modelo de una sola persona. Aquí no se contrata a una persona: se contrata a un equipo con las siete disciplinas adentro, y lo único que se decide es cuántos ingenieros quedan dedicados a tiempo completo. Es el mismo equipo detrás de la plataforma que Diego vio en la reunión, la que hoy opera para David y Samuel.

TODO EL PROYECTO

Director de Proyecto y Arquitecto de Software

Carlos Carrasquero. Diseña el modelo de datos, decide la arquitectura, dirige el proyecto y es el interlocutor único de Diego.

DEDICADO

Ingeniero de Backend

Base de datos, seguridad, permisos e integraciones con el banco, el correo y WhatsApp. La parte que no se ve y sostiene todo lo demás.

DEDICADO

Ingeniero de Frontend

Las pantallas de oficina: obras, presupuestos, materiales, compras, cajas, cuentas y reportes. Donde viven la administradora, las arquitectas y los ingenieros.

DEDICADO

Ingeniero de Aplicaciones Móviles

El portal del líder de equipo y del contratista en Android: partidas, cámara con fecha y ubicación, carga con señal débil y aviso del día de pago.

AGOSTO Y POR FASE

Diseñador de Producto

Dibuja las pantallas con la gente de Remodela antes de que se programe nada. Es la diferencia entre un sistema que se adopta y uno que se abandona.

POR FASE

Ingeniero de Inteligencia Artificial

El asistente conectado a la base de datos y la lectura de la evidencia de obra: que las fotos correspondan a la partida y se comparen contra la semana anterior.

CONTINUO

Analista de Calidad

Prueba cada entrega en el ambiente de pruebas antes de que la vea el equipo. Nadie debería descubrir un error en medio de un jueves de pago.

DESDE AGOSTO

Ingeniero Residente

La reunión semanal con Diego y la administradora, el canal directo, la capacitación de la gente nueva de cada obra y la gestión del plan. Es la compañía que Diego pidió, con día y hora.

Las condiciones

CONTRATO DE OBRA

Se contrata como Remodela contrata una obra: anticipo de movilización, valuaciones mensuales contra partidas ejecutadas y aceptadas, y retención. Lo que no esté en el cómputo se cotiza como partida nueva, se firma antes de ejecutar y se valúa igual.

Las tres opciones

El alcance es el mismo completo en las tres. Lo que se decide es en cuántos meses se tiene.

	A · Dos ingenieros	B · Tres ingenieros	C · Cuatro ingenieros
Diseño	Agosto 2026	Agosto 2026	Agosto 2026
Desarrollo	9 meses	6 meses	5 meses
Primera entrega	Noviembre 2026	15 de octubre 2026	Octubre 2026
Entrega completa	Mayo 2027	28 de febrero 2027	Enero 2027
Contrato de obra	USD 21.700	USD 24.000	USD 26.900
Anticipo de movilización	USD 4.340	USD 4.800	USD 5.380
Valuaciones	10 de USD 1.736	7 de USD 2.743	6 de USD 3.587
Retención del 10%	USD 1.736	USD 1.920	USD 2.152
Ingeniero residente	USD 650 al mes	USD 850 al mes	USD 1.100 al mes
Desembolso mensual	USD 2.212	USD 3.319	USD 4.328

Forma de pago

- Anticipo de movilización del 20% a la firma, amortizable contra cada valuación.
- Valuaciones mensuales contra partidas ejecutadas y aceptadas. Cada fase trae sus criterios de aceptación escritos antes de empezarla, en el idioma de la operación y no en el técnico.
- Retención del 10% descontada de cada valuación y liberada treinta días después del acta final. Es el fondo de garantía de Remodela y no hay que pedirlo.
- El desembolso mensual dura lo que dura el desarrollo. En la opción B son siete meses; a partir de marzo de 2027 solo queda el ingeniero residente.

Propiedad y continuidad

- Todo a nombre de Remodela tu Mundo desde el día uno: repositorio del código, nube, base de datos y dominio, con el correo de Diego como dueño. crescō entra como colaborador.
- Respaldo exportable cada semana en el Drive de Remodela, en formato abierto. La administradora lo guarda y no depende de crescō para tenerlo.

- Continuidad escrita:** documentación viva y video de traspaso técnico al cierre de cada fase. Si crescō no puede continuar, en cinco días hábiles Remodela tiene todo lo necesario para que cualquier desarrollador siga adelante.
 - Salida limpia al final de cada fase**, sin penalidad. Lo entregado queda funcionando y en la nube de Remodela.
-

El acompañamiento

El **ingeniero residente arranca en agosto**, no cuando termina el proyecto. Incluye la reunión fija semanal, canal directo con respuesta en cuatro horas hábiles y en dos los jueves, capacitación de la gente nueva que entra en cada obra, gestión del plan, y hasta USD 250 al mes de nube, correo, WhatsApp y consumo del asistente. Lo que exceda esos USD 250 se factura al costo, con la factura del proveedor a la vista. Es el mismo número después de febrero: no es un rango que luego se negocia.

Fuera del alcance

Emisión de facturas fiscales homologadas ante el SENIAT · débito bancario automático a contratistas · mantenimiento o corrección del sistema actual en PHP · la marca propia de sanitarios importados · control de herramientas del taller y postventa. Todos se cotizan aparte, con su propio presupuesto, cuando haya certeza de fecha y alcance.

Aceptación

La aceptación de esta propuesta se formaliza con la firma del contrato de obra y el pago del anticipo de movilización. Con la firma quedan reservados el equipo de tres ingenieros y el arranque del diseño el lunes 3 de agosto.

Diego Alesi
Remodela tu Mundo

Carlos Carrasquero
crescō · Director de Proyecto

Vigencia

Alcance y precio firmes hasta el **viernes 14 de agosto de 2026**. No es una fecha de presión: es hasta donde hay agenda libre para reservar tres ingenieros sin empujar a otro cliente. Cerrando antes del **31 de julio**, el diseño arranca el lunes 3 de agosto.
